





















Nr.		Task Name	Anfang	Ende	orgäng	Ressourcenkürzel	Arbeit	Ist-Arbeit	Restarbeit	Jan	1. Qtl, 2019 Feb
1		ERP-Neu	Fre 22.02.19	Mit 04.12.19			4.882,4 Std.	0 Std.	4.882,4 Std.		
2		Projektmanagement	Fre 22.02.19	Mit 04.12.19			1.388 Std.	0 Std.	1.388 Std.		
3		Projekt-Auftrag erstellen	Fre 22.02.19	Fre 22.02.19		PM;AG	12 Std.	0 Std.	12 Std.		
4		Projekt-Team finden	Mon 25.02.19	Fre 01.03.19	3	PM;AG	48 Std.	0 Std.	48 Std.		
5		Kick-Off Meeting	Mon 04.03.19	Mon 04.03.19	4	PM	8 Std.	0 Std.	8 Std.		
6		Projekt-Controlling	Die 05.03.19	Mon 14.10.19	5	PM	1.280 Std.	0 Std.	1.280 Std.		
7		Update Projektplan nach Planungsphase	Die 02.04.19	Die 02.04.19	14	PM	8 Std.	0 Std.	8 Std.		
8		Update Projektplan nach Pflichtenheft-Erstellung	Mon 12.08.19	Mon 12.08.19	27	PM	8 Std.	0 Std.	8 Std.		
9		Lessons-Learned Meeting	Mon 02.12.19	Mon 02.12.19	36	PM	8 Std.	0 Std.	8 Std.		
10		Formeller Projektabschluss	Die 03.12.19	Mit 04.12.19	9;6	PM	16 Std.	0 Std.	16 Std.		
11		Planung	Die 05.03.19	Mon 01.04.19			680 Std.	0 Std.	680 Std.		
12		Ist-Analyse durchführen	Die 05.03.19	Mon 18.03.19	5	PM;AM;BH;IT;ASS	360 Std.	0 Std.	360 Std.		
13		Soll-Situation definieren	Die 19.03.19	Mon 25.03.19	12	PM;AG;AM;BH;IT;ASS	220 Std.	0 Std.	220 Std.		
14		Business-Case erstellen	Die 26.03.19	Mon 01.04.19	13	PM;BH;ASS	100 Std.	0 Std.	100 Std.		
15		MS: Projekt ist zur Umsetzung freig	Mon 01.04.19	Mon 01.04.19	14		0 Std.	0 Std.	0 Std.		
16		Beschaffung	Die 02.04.19	Mon 22.07.19			1.592 Std.	0 Std.	1.592 Std.		
17		Lastenheft erstellen	Die 02.04.19	Mon 29.04.19	15	IT;PM;AM;BH;ASS	720 Std.	0 Std.	720 Std.		
18		Anbieter finden	Die 30.04.19	Mon 13.05.19	17	PM;ASS	120 Std.	0 Std.	120 Std.		
19		Angebote einholen und bewerten	Die 14.05.19	Mon 03.06.19	18	PM;AM;ASS;BH;IT	288 Std.	0 Std.	288 Std.		
20		Verhandlungen mit Shortlist-Anbiet	Die 04.06.19	Mon 01.07.19	19	PM;AG;ASS;AM;BH;IT	400 Std.	0 Std.	400 Std.		
21		Auftragsvergabe	Die 02.07.19	Mon 08.07.19	20	PM;AG;ASS	64 Std.	0 Std.	64 Std.		
22		Puffer Beschaffung	Die 09.07.19	Mon 22.07.19	21		0 Std.	0 Std.	0 Std.		
23		MS: Auftrag ist vergeben	Mon 22.07.19	Mon 22.07.19	21;22		0 Std.	0 Std.	0 Std.		
24		Implementierung	Die 23.07.19	Don 31.10.19			1.016 Std.	0 Std.	1.016 Std.		
25		Kick-Off Meeting Implementierung	Die 23.07.19	Die 23.07.19	23	PM;AM;ASS;BH;IT;LIEF	27,2 Std.	0 Std.	27,2 Std.		
26		Demo-System installieren	Mit 24.07.19	Fre 26.07.19	25	LIEF	24 Std.	0 Std.	24 Std.		
27		Pflichtenheft erstellen	Mon 29.07.19	Fre 09.08.19	26	PM;AM;ASS;BH;IT;LIEF	272 Std.	0 Std.	272 Std.		
28		Basis-System installieren	Mon 12.08.19	Fre 16.08.19	27	LIEF;IT	52 Std.	0 Std.	52 Std.		
29		Konfiguration ERP durchführen	Mon 19.08.19	Fre 30.08.19	28	LIEF;IT	104 Std.	0 Std.	104 Std.		
30		Testbetrieb durchführen	Don 05.09.19	Mit 18.09.19	31	PM;AM;BH;IT;LIEF	232 Std.	0 Std.	232 Std.		
31		User schulen	Mon 02.09.19	Mit 04.09.19	29	LIEF;AG;AM;ASS;BH;PM	76,8 Std.	0 Std.	76,8 Std.		
32		Lösung produktiv setzen (Go-Live)	Don 19.09.19	Mit 25.09.19	30	IT;LIEF;PM	92 Std.	0 Std.	92 Std.		
33		Abnahme durchführen	Don 26.09.19	Mit 02.10.19	32	PM;AM;ASS;BH;IT;LIEF	136 Std.	0 Std.	136 Std.		
34		Puffer Implementierung	Don 03.10.19	Mit 30.10.19	33		0 Std.	0 Std.	0 Std.		
35		MS: Lösung fertig implementiert	Don 31.10.19	Don 31.10.19	33;34		0 Std.	0 Std.	0 Std.		
36		Abschluss	Fre 01.11.19	Fre 29.11.19			206,4 Std.	0 Std.	206,4 Std.		
37		Techn. Schulung für IT-Betrieb	Fre 01.11.19	Mon 04.11.19	35	LIEF;IT	20,8 Std.	0 Std.	20,8 Std.		
38		Support-Vertrag unterschreiben	Die 05.11.19	Don 07.11.19	37	PM;IT;LIEF	55,2 Std.	0 Std.	55,2 Std.		

Project: ERP-Neu PMP.mpp

Date: Mit 13.03.19


Task


Milestone


Summary


Project Summary


Critical Path












Inactive Task


Inactive Milestone


Inactive Summary


Manual Task


Duration-only












Manual Summary Rollup


Manual Summary


Start-only


Finish-only


Deadline























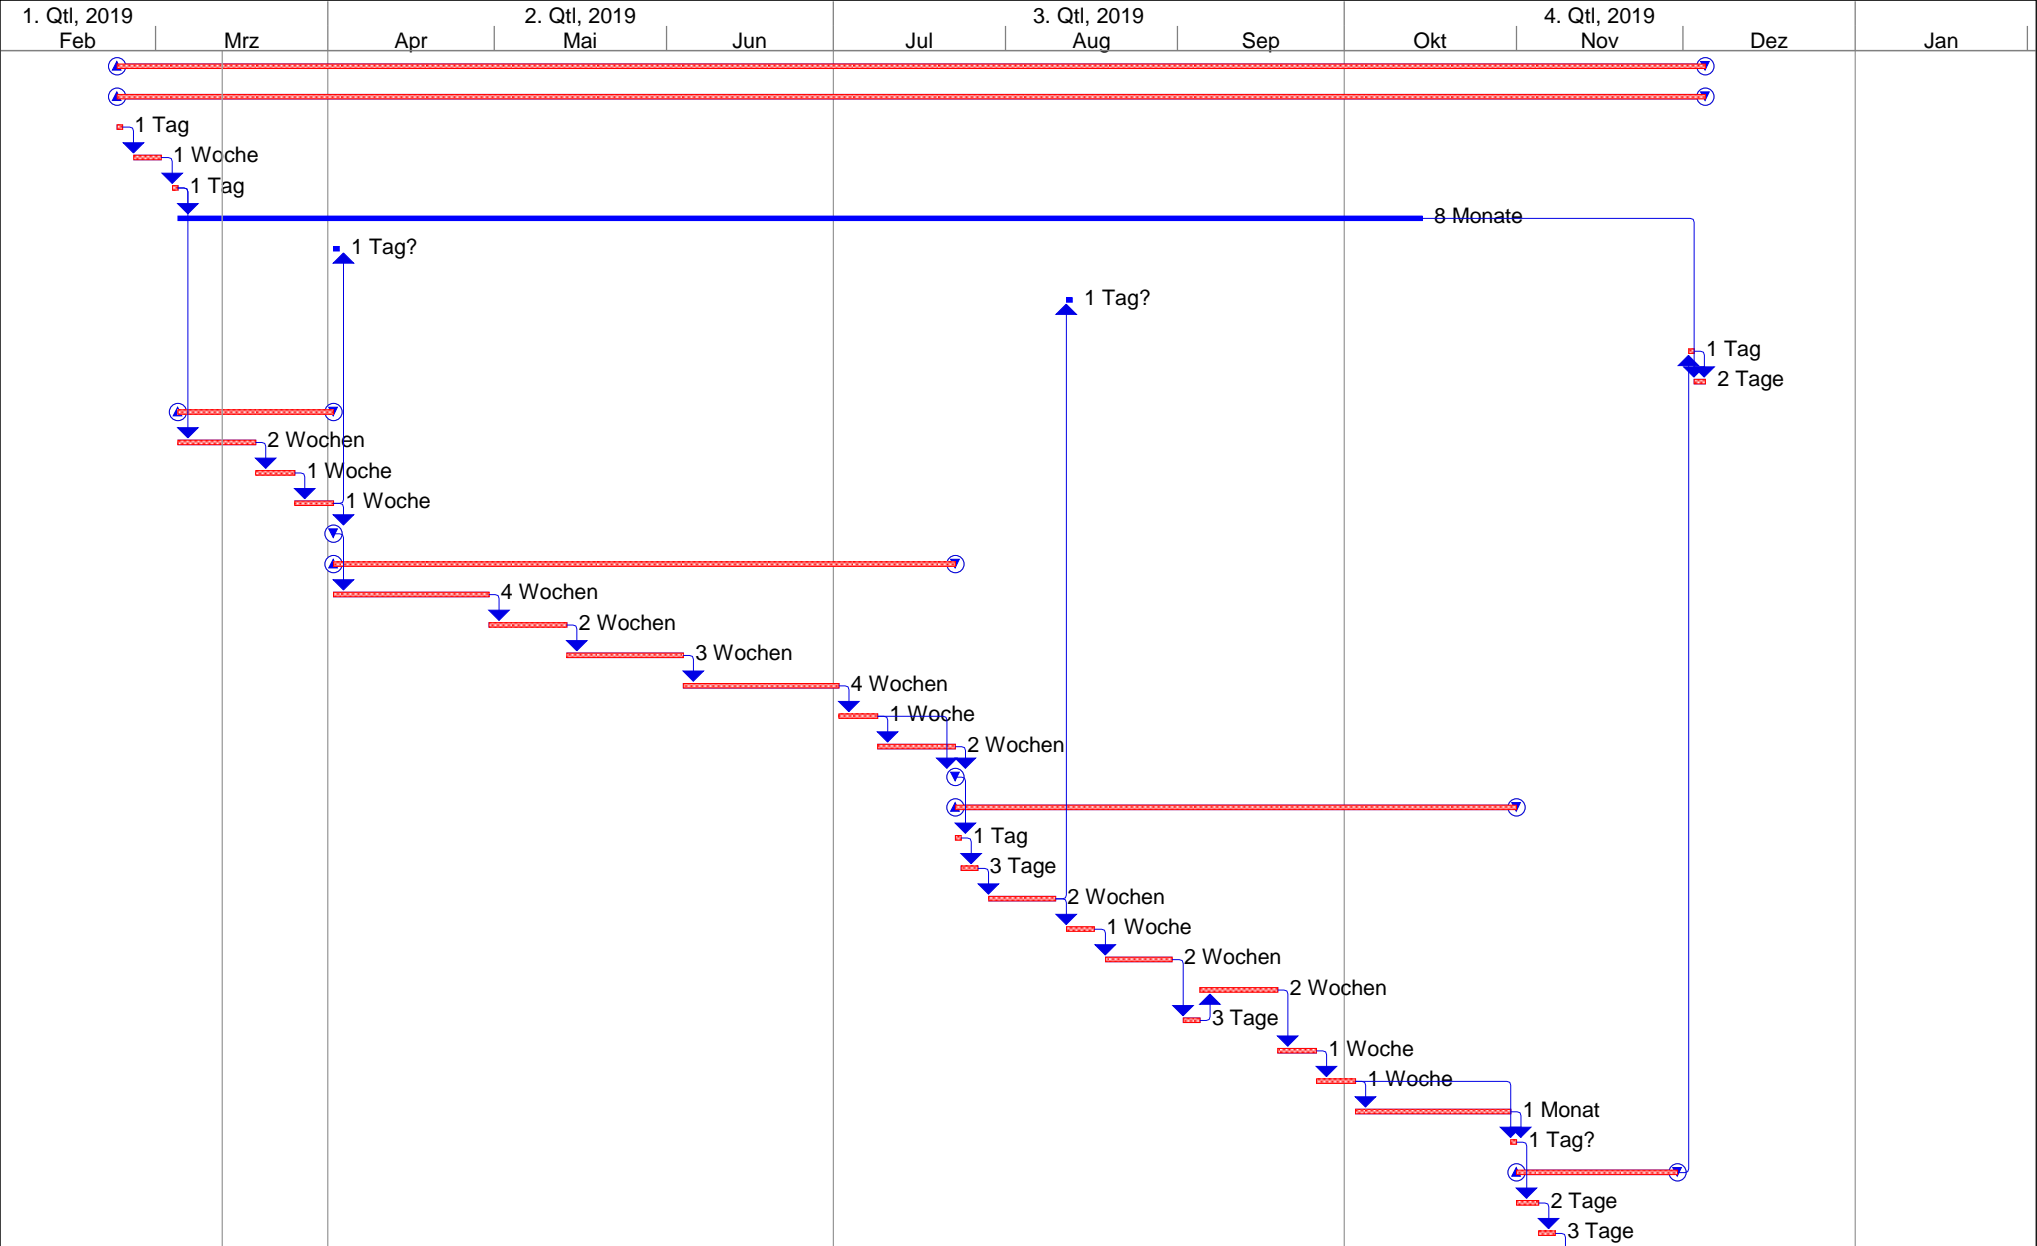



















Nr.		Task Name	Anfang	Ende	orgäng	Ressourcenkürzel	Arbeit	Ist-Arbeit	Restarbeit	Jan	1. Qtl, 2019 Feb
39		Dokumentation abschliessen	Fre 08.11.19	Don 14.11.19	38	PM;ASS;IT;LIEF	112 Std.	0 Std.	112 Std.		
40		Übergabe an den IT-Betrieb	Fre 15.11.19	Fre 15.11.19	39	PM;IT;LIEF	18,4 Std.	0 Std.	18,4 Std.		
41		MS: IT-Lösung ist an Betrieb überg	Fre 15.11.19	Fre 15.11.19	40		0 Std.	0 Std.	0 Std.		
42		Puffer Projektabschluss	Mon 18.11.19	Fre 29.11.19	41		0 Std.	0 Std.	0 Std.		



Project: ERP-Neu PMP.mpp Date: Mit 13.03.19	Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary	
	Summary		Inactive Summary		Start-only	
	Project Summary		Manual Task		Finish-only	
	Critical Path		Duration-only		Deadline	



Project: ERP-Neu PMP.mpp Date: Mit 13.03.19	Task Milestone Summary Project Summary Critical Path	 Inactive Task  Inactive Milestone  Inactive Summary  Manual Task  Duration-only	 Manual Summary Rollup  Manual Summary  Start-only  Finish-only  Deadline	    
--	--	---	--	---

1. Qtl, 2019 Feb	Mrz	Apr	2. Qtl, 2019 Mai	Jun	Jul	3. Qtl, 2019 Aug	Sep	Okt	4. Qtl, 2019 Nov	Dez	Jan



Project: ERP-Neu PMP.mpp Date: Mit 13.03.19	Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary	
	Summary		Inactive Summary		Start-only	
	Project Summary		Manual Task		Finish-only	
	Critical Path		Duration-only		Deadline	
